



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 10:00 horas del día 12 de Noviembre de 2018, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: “Ampliación de red de alcantarillado sanitario (487 ml) y descargas domiciliarias (52), en la colonia Zaragoza, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S. ”, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obra, el C. Manuel Salvador Higuera Hernández, Residente de Obra; y por el Contratista, el Ing. Jesús Omar Campos Cota, en su carácter de Superintendente de Obra, representando a la empresa NEO Construction, S.A. de C.V.; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Apartado Urbano (APAU) del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) con recursos del ramo 16, del ejercicio presupuestal 2018.

I. Información básica.

Programas:	APAU de PROAGUA ejercicio 2018.
Nombre de la Obra:	Ampliación de red de alcantarillado sanitario (487 ml) y descargas domiciliarias (52), en la colonia Zaragoza, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$1,011,777.00 (Son un millón once mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Validación:	No. B00.903.05.-2053.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a Cuando menos Tres No.IO-903017989-E6-2018
Contrato número:	No.IO-903017989-E6-2018
Firma:	06 de agosto de 2018.
Importe del contrato:	\$991,155.53 (Son novecientos noventa y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 53/100 M.N. con I.V.A.).

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Contratista: NEO Construction, S.A. de C.V
 R.F.C.: NCO1006227L7
 Fecha inicio programada: 10 de Agosto de 2018.
 Fecha terminación programada: 08 de Noviembre de 2018.
 Fecha inicio real: 10 de Agosto de 2018.
 Fecha terminación real: 08 de Noviembre de 2018.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	No hubo	\$0.00	
Cumplimiento	3521-00998-3	\$99,115.55	Afianzadora Aserta, S.A. de C.V.

II. Descripción de los trabajos ejecutados.

La obra consistió en la ejecución de los siguientes conceptos: Instalación de 462.10 m de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro en sistema ingles srd 35 de 200 mm de diámetro, 51 descargas domiciliarias completas con tubería de PVC alcantarillado de 6" sistema ingles srd 35, silletas de 8"x6" de diámetro, codo de 45°x6", 51 registros de albañal con muros de tabique de 14cm de 0.40 x 0.60 x 0.75m de profundidad, aplanados con mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro. Construcción de 11 pozos de visitas tipo común completos en diferentes profundidades, 3 interconexiones en diferentes calles, plantillas y rellenos compactados con material de producto de banco, reposición de base hidráulica de 20 cm con acabado en pavimento con carpeta asfáltica y en banquetas con concreto hidráulico, así mismo se hace la entrega de 24.90m de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro en sistema ingles srd 35 y 60.95m de tubería de PVC alcantarillado de 6" sistema ingles srd 35; con una inversión total de \$991,155.53 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado, a través del

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Urbano del ejercicio 2018; resultando una mezcla total de recursos del 60% de aportación Federal, 40% aportación Estatal

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO** de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega de El Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Plano de Obra Terminada.
- Certificado de Funcionamiento.

III. Balance financiero.

Inversión (c/I.V.A.):

	Total	Federal (60%)	Estatad (40%)
Contrato Inicial:	\$991,155.53	\$549,693.32	\$396,462.21

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

	Ejecutado	Federal (60%)	Estatad (40%)
APAUR 2018:	\$991,155.53	\$549,693.32	\$396,462.21

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total	Amortización Anticipo
Anticipo		---	\$0.00	\$0.00	\$0.00	---
Estimación 1EXT	APAUR 2018	10/AGOSTO/18 - 10/OCTUBRE/18	\$147,363.49	\$23,578.15	\$170,941.64	\$0.00
Estimación 2N ADICIONAL EXT.	APAUR 2018	11/OCTUBRE/18 - 8/NOV/18	\$707,080.94	\$113,132.95	\$820,213.89	\$0.00
TOTAL EJERCIDO			\$854,444.43	\$136,711.10	\$991,155.53	\$0.00

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

Entrega
Por "El Contratista"




Ing. Jesús Omar Campos Cota
NEO Construction, S.A. de C.V.

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**


Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua

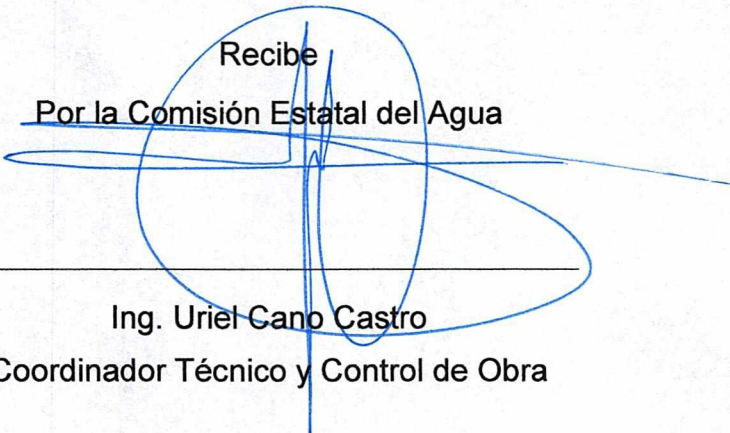

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y Control de Obra

Testigos



Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández
Residente de la Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega – Recepción de la obra denominada “Ampliación de red de alcantarillado sanitario (487 ml) y descargas domiciliarias (52), en la colonia Zaragoza, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S. ”, bajo el contrato número IO-903017989-E6-2018.
