

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 10:00 horas del día 12 de Noviembre de 2018, se reunieron en el sitio que ocupa la obra: “Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario (442 ml) y descargas domiciliarias (37), en la colonia Miramar, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.”, los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el Ing. Uriel Cano Castro, Coordinador Técnico y Control de Obra, el C. Manuel Salvador Higuera Hernández, Residente de Obra; y por el Contratista, el Ing. Jesús Omar Campos Cota, en su carácter de Superintendente de Obra, representando a la empresa NEO Construction, S.A. de C.V.; para llevar a cabo un recorrido con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Apartado Urbano (APAU) del Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) con recursos del ramo 16, del ejercicio presupuestal 2018.

I. Información básica.

| | |
|---|--|
| Programas: | APAU de PROAGUA ejercicio 2018. |
| Nombre de la Obra: | Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario (442 ml) y descargas domiciliarias (37), en la colonia Miramar, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S. |
| Inversión autorizada: | \$ 916,693.00 (Son un Novecientos Dieciséis mil Seiscientos Noventa y Tres pesos 00/100 M.N. con I.V.A.). |
| Oficio de Validación: | No. B00.903.05.-2053. |
| Modalidad de adjudicación del contrato: | Invitación a Cuando menos Tres No.IO-903017989-E7-2018 |
| Contrato número: | No.IO-903017989-E7-2018 |
| Firma: | 06 de agosto de 2018. |
| Importe del contrato: | \$ 910,528.32 (Son Novecientos Diez mil Quinientos Veintiocho pesos 32/100 M.N. con I.V.A.). |

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Contratista: NEO Construction, S.A. de C.V
R.F.C.: NCO1006227L7
Fecha inicio programada: 10 de Agosto de 2018.
Fecha terminación programada: 08 de Noviembre de 2018.
Fecha inicio real: 10 de Agosto de 2018.
Fecha terminación real: 08 de Noviembre de 2018.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia:

| Concepto | Fianza no. | Importe | Afianzadora |
|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| Anticipo | No hubo | \$0.00 | |
| Cumplimiento | 3521-00999-8 | \$91,052.83 | Afianzadora Aserta, S.A. de C.V. |

II. Descripción de los trabajos ejecutados.

La obra consistió en la ejecución de los siguientes conceptos: Instalación de 415.41 m de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro en sistema ingles srd 35 de 200 mm de diámetro, 36 descargas domiciliarias completas con tubería de PVC alcantarillado de 6" sistema ingles srd 35, silletas de 8"x6" de diámetro, codo de 45"x6", 36 registros de albañal con muros de tabique de 14cm de 0.40 x 0.60 x 0.75m de profundidad, aplanados con mortero cemento-arena 1:3 y tapa de concreto con marco de fierro. Construcción de 8 pozos de visitas tipo común completos en diferentes profundidades, 3 interconexiones en diferentes calles, plantillas y rellenos compactados con material de producto de banco, excavación con equipo en material tipo roca en zona "c", así mismo se hace la entrega de 27.35m de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro en sistema ingles srd 35 y 21.98m de tubería de PVC alcantarillado de 6" sistema ingles srd 35; con una inversión total de \$910,528.32 incluye el 16% del Impuesto al Valor Agregado, a través del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Urbano del ejercicio 2018; resultando una mezcla total de recursos del 60% de aportación Federal, 40% aportación Estatal

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la obra SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con las especificaciones de proyecto e inversión ejercida en condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.

Forma parte de la entrega de El Contratista:

- Finiquito de Obra.
- Plano de Obra Terminada.
- Certificado de Funcionamiento.

III. Balance financiero.

Inversión (c/I.V.A.):

| | Total | Federal (60%) | Estatad (40%) |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Contrato Inicial: | \$ 910,528.32 | \$546,316.99 | \$364,211.33 |

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

| | Ejecutado | Federal (60%) | Estatad (40%) |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| APAU 2018: | \$ 910,528.31 | \$546,316.99 | \$364,211.32 |

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

| Concepto | Programa | Periodo ejecución | Subtotal | I.V.A. | Total | Amortización Anticipo |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Anticipo | | --- | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | --- |
| Estimación 1EXT | APAU 2018 | 10/AGOSTO/18 - 10/OCTUBRE/18 | \$ 128,136.18 | \$ 20,501.79 | \$148,637.97 | \$0.00 |
| Estimación 2N ADICIONAL EXT. | APAU 2018 | 11/OCTUBRE/18 -8/NOV/18 | \$ 656,802.02 | \$105,088.32 | \$ 761,890.34 | \$0.00 |
| TOTAL EJERCIDO | | | \$ 784,938.20 | \$ 125,590.11 | \$ 910,528.31 | \$0.00 |

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$ 910,528.32 (Son novecientos diez mil quinientos veintiocho pesos 32/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$ 910,528.31 (Son novecientos diez mil quinientos veintiocho pesos 31/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%; resultando un saldo no ejercido y cancelado por un importe de \$0.01 (Son ceros pesos 01/100 m.n.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%.

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta acta recibe de El Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

Entrega

Por "El Contratista"




Ing. Jesús Omar Campos Cota
NEO Construction, S.A. de C.V.

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua

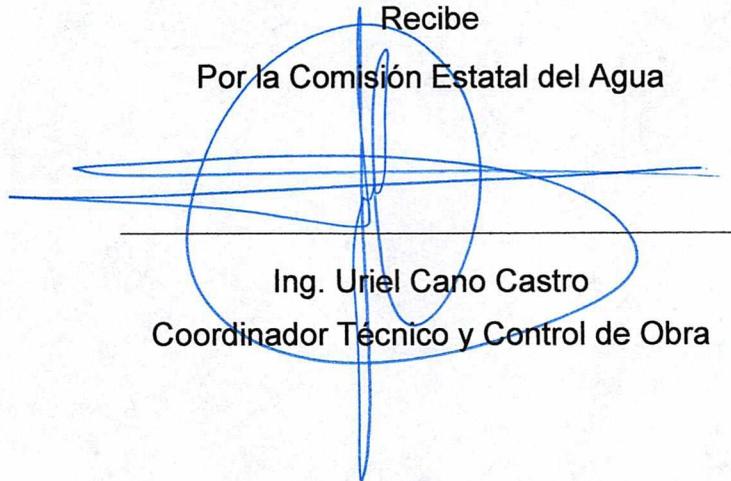

Ing. Uriel Cano Castro


Coordinador Técnico y Control de Obra

Testigos



Ing. Manuel Salvador Higuera Hernández

Residente de la Obra



Esta hoja forma parte del Acta de Entrega – Recepción de la obra denominada “Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario (442 ml) y descargas domiciliarias (37), en la colonia Miramar, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S.”, bajo el contrato número IO-903017989-E7-2018.
