



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Siendo las 08:30 horas del día 06 de diciembre del 2018, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, el Ing. Guillermo Romero Sillas, en su carácter de Representante Legal de ROSI CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: "Reconstrucción del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte" (zona de Laguna seca), en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° LO-903017989-E5-2018, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), para el ejercicio 2018.

Información básica.

| | |
|---|--|
| Programas: | Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), para el ejercicio 2018. |
| Nombre de la Obra: | "Reconstrucción del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte" (zona de Laguna seca), en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S. |
| Inversión autorizada: | \$6,000,000.00 (Son: Seis millones, de pesos 00/100 M.N. con I.V.A.). |
| Oficio de Autorización: | B00.903.05.-2053 de fecha 13 de julio de 2018 emitido por la CONAGUA. |
| Modalidad de adjudicación del contrato: | Licitación Pública Nacional. |
| Contrato número: | LO-903017989-E5-2018. |
| Firma: | 05 de septiembre de 2018. |
| Importe del contrato: | \$6,650,511.44 (Son Seis millones, seiscientos cincuenta mil, quinientos once pesos 44/100). |
| R.F.C.: | RCO020903HU3 |
| Fecha de inicio programada: | 05 de septiembre de 2018. |
| Fecha de terminación programada: | 31 de diciembre de 2018. |
| Fecha de inicio real: | 05 de septiembre de 2018. |
| Fecha de terminación real: | 30 de noviembre de 2018. |

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Descripción de los trabajos ejecutados:

Suministro y colocación de letrero alusivo a la obra; Excavación con equipo en zanjas en material común zona "B" en seco; Relleno a volteo en zanjas con equipo con material producto de excavación; Suministro de 1,524.00 metros de tubería termofusionable de PEAD IPS DE 16" de diámetro, RD-9; Instalación de 1,428.00 metros de tubería termofusionable de PEAD IPS DE 16" de diámetro, RD-9; Suministro e instalación de dos derivaciones verticales de 16" x 4" de diámetro; Suministro e instalación de dos jaulas para protección de válvulas; Dos interconexiones de tubería de polietileno de alta densidad termofusionable de 16" de diámetro; Suministro e instalación de derivación horizontal de 16" x 6" de diámetro; Suministro e instalación de derivación horizontal de 16" x 6" de diámetro; Suministro y colocación de reducción de PEAD IPS de 16" x 14" de diámetro PE4710, RD-9; Carga y acarreo en tracto camión y cama baja de tubería PEAD de 12.00 metros de largo por 16" de diámetro, incluye carga y acarreo a 48 Kms. De pie de obra a almacén de SAPA en cárcamo de Rebombéo.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la "Reconstrucción del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte" (zona de Laguna seca), en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, B.C.S., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión autorizada \$6,000,000.00 (Son seis millones de pesos 00/100 M.N.), c/I.V.A:

| Contrato Inicial: | Total | Federal (60%) | Estatad (40%) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | \$6,650,511.44 | \$3,990,306.86 | \$2,660,204.58 |

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

| Inversión ejercida de la inversión autorizada: | Total | Federal (60%) | Estatad (40%) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | \$5,999,909.08 | \$3,599,945.44 | \$2,399,963.64 |

Inversión no ejercida (c/I.V.A.):

| Inversión no ejercida de la inversión autorizada: | Total | Federal (60%) | Estatad (40%) |
|---|---------|---------------|---------------|
| | \$90.92 | \$54.56 | \$36.36 |

A


X

ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Entrega


Por el Contratista




C. Ing. Guillermo Romero Sillas
Representante Legal de
ROSI CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

Recibe

Por la Comisión Estatal del Agua



Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico y Control de Obras

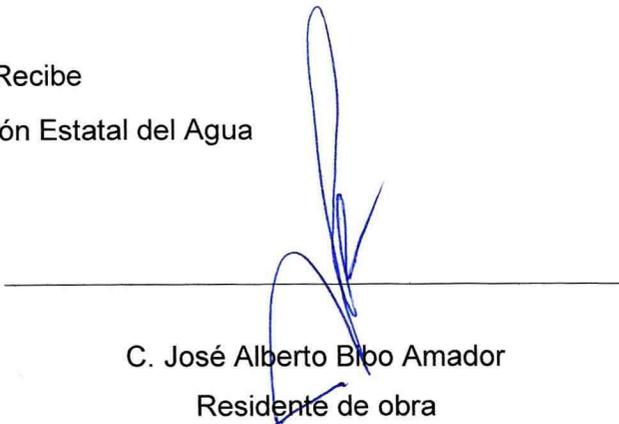

C. José Alberto Bibo Amador
Residente de obra
