

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 13 de octubre del 2020, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, la C. Olivia Esthela Vargas Gavarain, en su carácter de Administradora Única de Gerencia de Infraestructura Baja California, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE GUERRERO NEGRO, CONSISTENTE EN: 5028 ML DE TUBERIA PVC DE 3" RD 32.5 Y 176 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° **IO-903017989-E14-2020**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR), para el ejercicio 2020.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR), para el ejercicio 2020.
Nombre de la Obra:	"Construcción de red de agua potable en el sector 2 de Guerrero Negro, consistente en: 5028 ml de tubería PVC de 3" RD 32.5 y 176 tomas domiciliarias"
Inversión autorizada:	\$3,800,000.00 (Son: Tres millones, ochocientos mil pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0532 de fecha 03 de abril de 2020 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E14-2020.
Firma:	30 de junio de 2020.
Importe del contrato:	\$3,798,676.36 (Son tres millones, setecientos noventa y ocho mil, seiscientos setenta y seis pesos 36/100 M.N.).
R.F.C.:	GIB130923RX1
Fecha de inicio programada:	01 de julio de 2020.
Fecha de terminación programada:	29 de septiembre de 2020.
Fecha de inicio real:	01 de julio de 2020.




ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de terminación real:	29 de septiembre de 2020.
----------------------------	---------------------------

Descripción de los trabajos ejecutados:

En red de agua potable: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 4,984.31 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 3" de diámetro RD-32.5, 1,937.50 metros lineales de tubería de PVC de ½" de diámetro en tomas domiciliarias, 179 tomas domiciliarias con caja rectangular de polietileno y micromedidor.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la: **"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE GUERRERO NEGRO, CONSISTENTE EN: 5028 ML DE TUBERIA PVC DE 3" RD 32.5 Y 176 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, B.C.S., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/I.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
		\$3,798,676.36	\$1,899,338.18

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
		\$3,798,676.36	\$1,899,338.18



**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	01/07/2020- 29/07/2020.	\$1,898,492.33	\$303,758.78	\$2,202,251.11
Estimación 2N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	30/07/2020- 07/09/2020.	\$1,258,309.96	\$201,329.59	\$1,459,639.55
Estimación 3N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAU).	08/09/2020- 29/09/2020.	\$117,918.70	\$18,867.00	\$136,785.70
Total ejercido			\$3,274,720.99	\$523,955.37	\$3,798,676.36


El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Entrega

Por el Contratista



C. Olivia Esthela Vargas Gavarain




ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

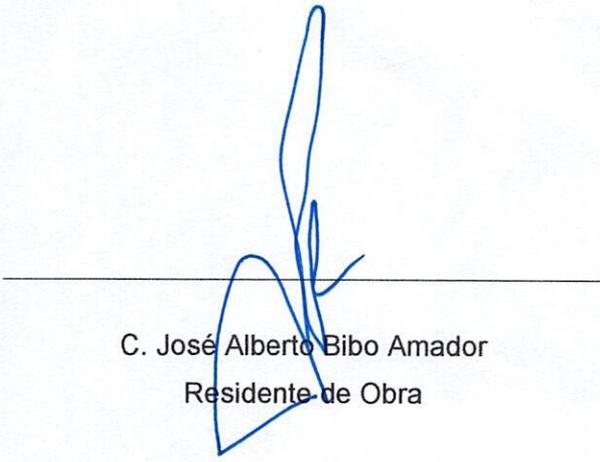

C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción de la obra: "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 2 DE GUERRERO NEGRO, CONSISTENTE EN: 5028 ML DE TUBERIA PVC DE 3" RD 32.5 Y 176 TOMAS DOMICILIARIAS", en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° IO-90.3017989-E14-2020.
