

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 14:00 horas del día 02 de diciembre del 2019, se reunieron en la Comisión Estatal del Agua cito en Sinaloa sin número, esquina Durango, Colonia Pueblo Nuevo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por La Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, la C. Ing. Perla Janet Gaxiola Hernández; para llevar a cabo el acto de finiquito de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, CONSISTENTE EN: 4,541.97 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML DE TUBERIA DE PCV TIPO ANGER DE 6" Ø RD 32.5 Y 141 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato N°. IO-903017989-E16-2019 se establece que con fecha 15 de noviembre de 2019 se han terminado los trabajos objeto del contrato No. IO-903017989-E16-2019 y recibidos el día 30 de noviembre de 2019, según consta en el Acta Entrega-Recepción de la obra.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de la red de agua potable en la colonia San Isidro Labrador, consistente en: 4,541.97 ml de tubería pvc anger de 3" ø rd 32.5, 481.98 ml de tubería de pcv tipo anger de 6" ø rd 32.5 y 141 tomas domiciliarias", en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S.
Inversión autorizada:	\$2,758,470.40 (Son: dos millones, setecientos cincuenta y ocho mil, cuatrocientos setenta pesos 40/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E16-2019.
Firma:	29 de agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$2,736,458.13 (Son dos millones, setecientos treinta y seis mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N.).
R.F.C.:	GAHP840325PZ1

G

A

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Fecha de inicio programada:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación programada:	28 de diciembre de 2019.
Fecha de inicio real:	30 de agosto de 2019.
Fecha de terminación real:	12 de noviembre de 2019.

Fianzas otorgadas a favor de la dependencia

Concepto	Fianza no.	Importe	Afianzadora
Anticipo	3521-01310-8	\$820,937.44	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Cumplimiento	3521-01311-5	\$273,645.81	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
Vicios Ocultos	3521-01439-8	\$241,325.90	Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

Balance financiero

Inversión total autorizada (c/I.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$2,736,458.13	\$1,368,229.07	\$1,368,229.06

G

A

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISION ESTATAL DEL AGUA.**

Inversión total ejercida (c/I.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	\$2,413,259.06	\$1,206,629.53	\$1,206,629.53

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	09/09/2019- 15/11/2019.	\$2,080,395.74	\$332,863.32	\$2,413,259.06
Total ejercido			\$2,080,395.74	\$332,863.32	\$2,413,259.06

El objeto de esta acta es el de finiquitar por parte del contratista los trabajos ejecutados con cargo al contrato antes referido, conforme al siguiente análisis:

La obra tuvo un contrato original por un importe de \$2,736,458.13 (Son dos millones, setecientos treinta y seis mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 13/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, del cual se efectuaron pagos al contratista por la cantidad de \$2,413,259.06 (Son dos millones, cuatrocientos trece mil, doscientos cincuenta y nueve pesos, 06/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado del 16%, resultando un saldo de \$323,199.07 (trescientos veintitrés mil, ciento noventa y nueve pesos 07/100 M.N.) con respecto al monto contratado.

La presente acta no exime a la compañía contratista de la obra, de los defectos o Vicios Ocultos que resultaren en la misma, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la dependencia contratante.


Forma parte de esta acta el expediente básico integrado por el Plano de Obra Terminada y Acta de Entrega-Recepción entre la empresa responsable de la obra y la Comisión Estatal del Agua.

Leído que fue por las personas que asistieron a la reunión y enteradas de su contenido, se firma la presente acta al calce y al margen de todas sus fojas útiles.





ACTA DE FINIQUITO DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Por el Contratista




C. Ing. Perla Janet Gaxiola Hernández

Por la Comisión Estatal del Agua



C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

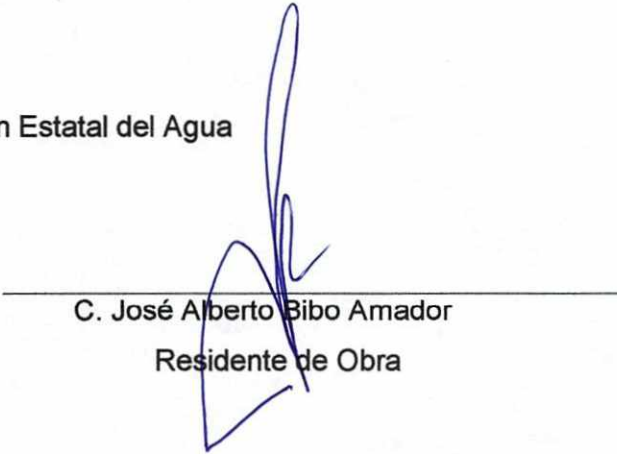

C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Entrega-Recepción entre la empresa constructora y la Comisión Estatal del Agua de la obra: **"AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, CONSISTENTE EN: 4,541.97 ML DE TUBERIA PVC ANGER DE 3" Ø RD 32.5, 481.98 ML DE TUBERIA DE PCV TIPO ANGER DE 6" Ø RD 32.5 Y 141 TOMAS DOMICILIARIAS"**, en la localidad de Cd. Constitución, municipio de Comondú, B.C.S., bajo el contrato N°. IO-903017989-E16-2019.
