

**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Siendo las 08:00 horas del día 22 de noviembre del 2019, se reunieron en el sitio que guarda la obra sito en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé, B.C.S., los representantes de las partes involucradas, por la Comisión Estatal del Agua, el C. Ing. Uriel Cano Castro y el C. José Alberto Bibó Amador, Coordinador Técnico y Control de Obras y Residente de Obra respectivamente; y por el Contratista, la C. Olivia Esthela Vargas Gavarain, en su carácter de Administradora Única de Gerencia de Infraestructura Baja California, S.A. de C.V.; para llevar a cabo el acto de Entrega-Recepción de la obra: **"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA EL PARAISO (7,328.00 ML Y 330 TOMAS DOMICILIARIAS) CON TUBERIA DE PVC TIPO ANGER DE 3" Y 6" Ø RD-32.5"**, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° **IO-903017989-E3-2019**, con el propósito de verificar y recibir físicamente los trabajos ejecutados dentro del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.

Información básica.

Programas:	Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAU), para el ejercicio 2019.
Nombre de la Obra:	"Ampliación de red de agua potable e instalacion de tomas domiciliarias en la colonia El Paraíso (7,328.00 ml y 330 tomas domiciliarias) con tubería de pvc tipo anger de 3" y 6" ø rd-32.5"
Inversión autorizada:	\$2,351,000.00 (Son: Dos millones, trescientos cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N. con I.V.A.).
Oficio de Autorización:	B00.903.03.-0324 de fecha 08 de julio de 2019 expedido por la Dirección Local de CONAGUA.
Modalidad de adjudicación del contrato:	Invitación a cuando menos tres personas.
Contrato número:	IO-903017989-E3-2019.
Firma:	07 de agosto de 2019.
Importe del contrato:	\$2,350,755.78 (Son dos millones, trescientos cincuenta mil, setecientos cincuenta y cinco pesos 78/100 M.N.).
R.F.C.:	GIB130923RX1
Fecha de inicio programada:	09 de agosto de 2019.
Fecha de terminación programada:	07 de noviembre de 2019.
Fecha de inicio real:	09 de agosto de 2019.



ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Fecha de terminación real:	07 de noviembre de 2019.
----------------------------	--------------------------

Descripción de los trabajos ejecutados:

En red de agua potable: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 9,640.00 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 3" de diámetro RD-32.5, 227.00 metros lineales de tubería de PVC tipo "anger" de 6" de diámetro RD-32.5, en tomas domiciliarias: Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de 1,233.50 metros lineales de tubería pvc de 1/2" de diámetro, 201 tomas domiciliarias con caja rectangular de polietileno y micromedidor.

Una vez verificada y cuantificada la obra por las partes que intervienen, se concluye que la: **"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA EL PARAISO (7,328.00 ML Y 330 TOMAS DOMICILIARIAS) CON TUBERIA DE PVC TIPO ANGER DE 3" Y 6" Ø RD-32.5"**, en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé, B.C.S., **SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO**, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, cumpliendo con lo estipulado en las especificaciones de proyecto e inversión ejercida por lo que está condiciones de ser recibida por la dependencia contratante.

Balance financiero:

Inversión total contratada (c/l.V.A.):

Contrato Inicial	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	✓ \$2,350,755.78	✓ \$1,175,377.89	✓ \$1,175,377.89

Inversión total ejercida (c/l.V.A.):

Inversión ejercida del contrato	Total	Federal (50%)	FAIS (50%)
	✓ \$2,265,704.58	✓ \$1,132,852.29	✓ \$1,132,852.29

X

A

C


**ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.**

Concepto	Programa	Periodo ejecución	Subtotal	I.V.A.	Total
Estimación 1N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	22/08/2019-31/08/2019.	\$437,016.47	\$69,922.64	\$506,939.11
Estimación 2N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	01/09/2019-30/09/2019.	\$701,095.42	\$112,175.27	\$813,270.69
Estimación 3N	(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR).	01/10/2019-07/10/2019.	\$815,081.71	\$130,413.07	\$945,494.78
Total ejercido			\$1,953,193.60	\$312,510.98	\$2,265,704.58

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisión Estatal del Agua, por medio de esta recibe de el Contratista los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime pertinentes, de conformidad con los términos del contrato y con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Entrega

Por el Contratista




C. Olivia Esthela Vargas Gavarain





ACTA ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
ENTRE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.

Por la Comisión Estatal del Agua

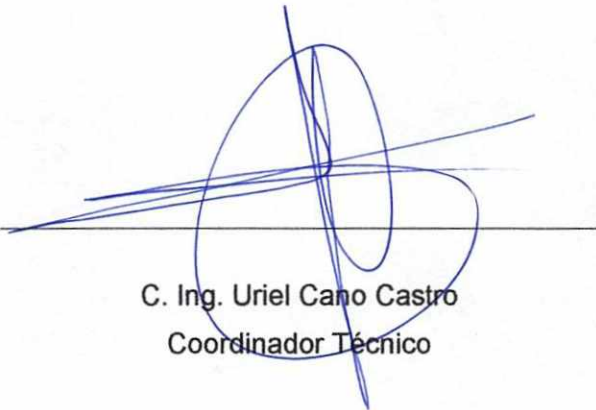

C. Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

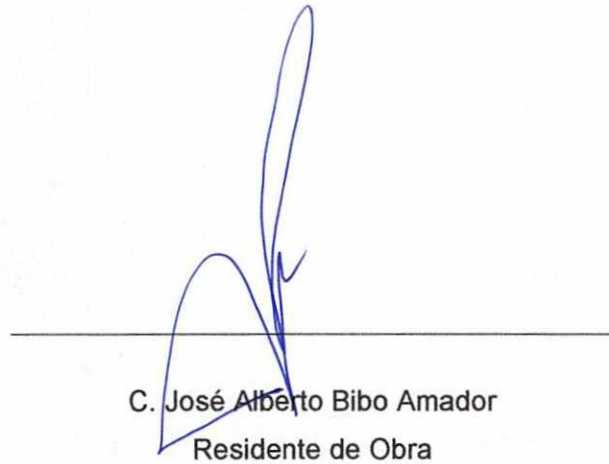

C. José Alberto Bibó Amador
Residente de Obra

Esta hoja forma parte del Acta de Finiquito de la obra: "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA EL PARAISO (7,328.00 ML Y 330 TOMAS DOMICILIARIAS) CON TUBERIA DE PVC TIPO ANGER DE 3" Y 6" Ø RD-32.5", en la localidad de Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, municipio de Mulegé, B.C.S., bajo el contrato N° IO-90.3017989-E3-2019.
