

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		1/2021U033			
Descripción de la Obra / Acción					
REPOSICIÓN DE EMISORA A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12"Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.					
Fecha de Inicio de la Obra:		30/07/21	Fecha Terminación de la Obra:		28/09/21
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)					
25.269509, -111.782798					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2297442		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	10/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	21/07/2021	Fecha Fallo	28/07/2021
Fecha Inicio Contrato	30/07/2021	Fecha Terminación Contrato	28/09/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 298,740.08	\$ 298,740.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	4%	47%	49%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,899.21	\$ 280,815.68	\$ 292,765.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 597,480.16

Avance Fisico Real en el MES (%)			Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
MES	Fisico (%)	OBSERVACIONES	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
Marzo	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Abril	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Mayo	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Junio	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Julio	5%		\$ -	\$ -	\$ -
Agosto	53%		\$ -	\$ -	\$ -
Sept.	41%		\$ -	\$ -	\$ -
Octubre	1%		\$ -	\$ -	\$ -
Noviembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Diciembre	0%		\$ -	\$ -	\$ -
Total Acumulado	100%		\$ 597,480.16	\$ 298,740.08	\$ -

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
Marzo	N/A		N/A	N/A
Abril	N/A		N/A	N/A
Mayo	N/A		N/A	N/A
Junio	N/A		N/A	N/A
Julio				
Agosto				
Sept.				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
  
 Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	1/2021U034
Descripción de la Obra / Acción	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2, EN SANTA ROSALÍA.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra:	30/07/21	Fecha Terminación de la Obra:	28/09/21
-----------------------------	----------	-------------------------------	----------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.349506, -112.270076
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2297629		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	10/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	21/07/2021	Fecha Fallo	28/07/2021
Fecha Inicio Contrato	30/07/2021	Fecha Terminó Contrato	28/09/2021		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 559,380.85	\$ 559,380.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,761.70

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	3%	47%	50%	0%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,562.85	\$ 525,818.00	\$ 559,380.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,761.70

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	20%	
Agosto	80%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,118,761.70	559,380.85
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	1,118,761.70	559,380.85

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio			
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional de Agua  
  
**Ing. Julio César Villarreal Trasviña**  
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		1 / 2021 U031	
Descripción de la Obra / Acción			
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA UBICACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACUÍFERO DE LORETO.			
Fecha de Inicio de la Obra:	09/08/21	Fecha Terminación de la Obra:	08/10/21
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)		25.008426, -111.398676	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
Avance Físico (%)			
N/A			
EXPEDIENTE			
No. Contrato	Z306004		Tipo de Contratación
Adjudicación Directa			
Fecha de Publicación	29/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	09/08/2021	Fecha Término Contrato	08/10/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
\$ 99,585.80	\$ 17,573.96	\$ -	\$ -
Suma		\$ 117,159.76	

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	37%	50%	13%	0%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,349.11	\$ 58,579.88	\$ 15,230.77	\$ -	\$ -	\$ 117,159.76

Avance Físico Real en el MES ( % )		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	72%	
Sept.	27%	
Octubre	1%	
Noviembre	0%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	117,159.76	99,585.80
\$	-	-
\$	-	-
\$	117,159.76	99,585.80

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
  
 Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:		1/2021U032	
Descripción de la Obra / Acción			
CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA.			
Fecha de Inicio de la Obra:		02/08/21	
Fecha Terminación de la Obra:		31/12/21	
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			
24.137020, -110.313155			
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)			
Inversión Ejercida			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
N/A	N/A	N/A	N/A
			Avance Fisico (%)
			N/A
EXPEDIENTE			
No. Compra/Net	2306038		Tipo de Contratación
Adjudicación Directa			
Fecha de Publicación	29/07/2021	Fecha Presenta Propuestas	29/07/2021
Fecha Inicio Contrato	02/08/2021	Fecha Terminación Contrato	31/12/2021
Inversión CONTRATADA			
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador
Otros (FISE)	Suma		
\$ 720,000.02	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -
\$ 1,440,000.01			

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	20%	20%	20%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 719,999.99	\$ -	\$ -	\$ 720,000.02	\$ 1,440,000.01

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	25%	
Sept.	13%	
Octubre	37%	
Noviembre	25%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	720,000.02	720,000.02
\$	719,999.99	-
\$	-	-
\$	1,440,000.01	720,000.02

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto			
Sept.			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
 Ing. Lesvia Tatiana Davis-Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
  
 Ing. Julio César Villarreal Trasluz  
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
AMPLIACIÓN DE 395.00 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO E INSTALACIÓN DE 23 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA COLONIA ROMA, DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		05/10/2021		Fecha Terminación de la Obra:	
				31/12/2021	
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			24.137140, -110.279092		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2329422		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	16/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/09/2021	Fecha Fallo	01/10/2021
Fecha Inicio Contrato	05/10/2021		Fecha Termino Contrato	31/12/2021	
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 372,258.60	\$ 454,982.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 827,241.34


Datos requeridos

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272,989.64	\$ 272,989.64	\$ 281,262.06	\$ 827,241.34	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo	0%	
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	90%	
Noviembre	10%	
Diciembre	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *			
	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL
	\$	-	\$ -
	\$	-	\$ -
	\$	-	\$ -
	\$	-	\$ -
	\$	-	\$ -
	\$	-	\$ -
	\$	377,766.84	\$ 169,995.08
	\$	-	\$ -
	\$	338,334.30	\$ 152,250.44
	\$	716,101.14	\$ 322,245.52

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)				
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua



Ing. Julio César Villarreal Trujillo  
 Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)**  
**REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS TRATADAS-CANAL PARSHALL, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		05/10/2021	Fecha Terminación de la Obra:		31/12/2021
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)			24.106394, -110.348352		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Pl	2329886		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	16/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/09/2021	Fecha Fallo	01/10/2021
Fecha Inicio Contrato	05/10/2021	Fecha Término Contrato	31/12/2021		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 3,121,667.89	\$ 4,378,658.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500,326.52

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,475,107.75	\$ 2,475,107.75	\$ 2,550,111.02	\$ 7,500,326.52

Avance Físico Real en el MES ( % )		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Abril	0%	
Mayo	0%	
Junio	0%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	65%	
Noviembre	20%	
Diciembre	15%	
Enero	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	4,321,385.69	\$ 1,090,255.52
\$	1,438,609.73	\$ -
\$	1,177,044.33	\$ 2,031,412.37
\$	563,286.77	\$ -
\$	7,500,326.52	\$ 3,121,667.89

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
 Ing. Lesvia Tatiana Davis Moñón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
  
 Ing. Julio César Villanreal Trasmuña  
 Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos


Table with project details: ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION, Descripción de la Obra / Acción, Fecha de Inicio de la Obra, Fecha Terminación de la Obra, Ubicación Geografica, Inversión Ejercida, EXPEDIENTE, Inversión CONTRATADA.

Table: Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte). Columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total.

Table: Avance Fisico Real en el MES (%). Columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES.

Table: Avance Financiero Real en el MES (Pesos) \*. Columns: MES, INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL.

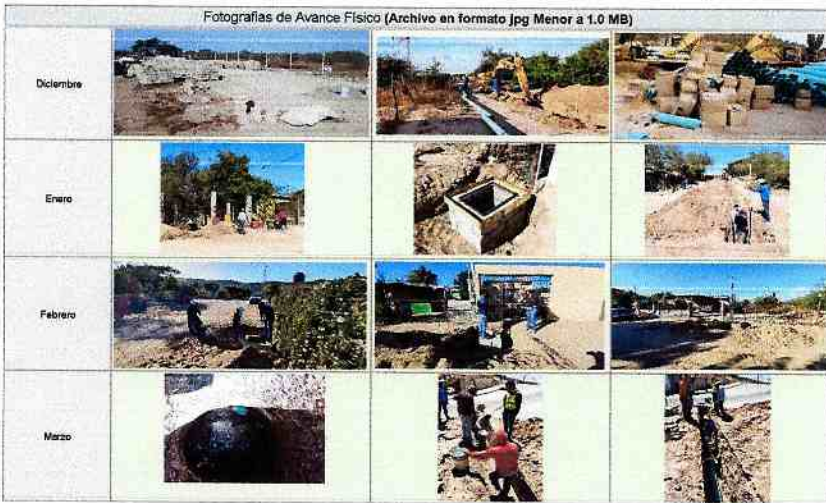

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Signature and name of Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón, Directora General.

Signature and name of Ing. Julio César Villarreal Trasviña, Director Local.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

**FS-PROAGUA-01**

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ					
Fecha de Inicio de la Obra:		18/11/2021		Fecha Terminación de la Obra:	
				30/06/2022	
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)				24.107543, -110.343386	
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2353323		Tipo de Contratación		Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación	27/10/2021	Fecha Presenta Propuestas	08/11/2021	Fecha Fallo	17/11/2021
Fecha Inicio Contrato	18/11/2021	Fecha Terminación Contrato	30/06/2022		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 19,509,467.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,509,467.53

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	80%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 975,473.38	\$ 15,607,574.01	\$ 19,509,467.53	

Avance Físico Real en el MES ( % )		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	0%	En proceso de fabricación los 3 equipos desarenadores, 6 bombas de cavidad progresiva de desplazamiento positivo y 3 set de variadores de frecuencia.
Noviembre	0%	
Diciembre	1%	
Enero	0%	
Febrero	0%	
Marzo	0%	
Total Acumulado	1%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	9,754,733.76	\$ 9,754,733.76
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	158,867.49	\$ 158,867.49
\$	9,913,601.25	\$ 9,913,601.25

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Octubre	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
Director Local



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha : 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción: ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA VIABILIDAD DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, EN CUENCAS HIDROLÓGICAS DE B.C.S.

Fecha de Inicio de la Obra : 26/11/2021 Fecha Terminación de la Obra : 31/03/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.137020, -110.313155

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. Compra/Ref	2362829		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	12/11/2021	Fecha Presenta Propuestas	22/11/2021	Fecha Fallo	24/11/2021
Fecha Inicio Contrato	26/11/2021		Fecha Termino Contrato	31/03/2022	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 708,325.63	\$ 124,998.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 833,324.27

Datos requeridos:

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	10%	20%	20%	20%	30%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,332.43	\$ 166,664.85	\$ 166,664.85	\$ 166,664.85	\$ 249,997.29	\$ 833,324.27	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Noviembre	0%	
Diciembre	6%	
Enero	4%	
Febrero	80%	
Marzo	100%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
MES	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Enero	\$ 127,456.07	\$ 108,337.67
Febrero	\$ -	\$ -
Marzo	\$ 705,868.20	\$ 599,987.96
Total Acumulado	\$ 833,324.27	\$ 708,325.63

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Traslviña  
 Director Local

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

**FS-PROAGUA-01**

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:	
Descripción de la Obra / Acción	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 3, EN SANTA ROSALÍA.	

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra :	01/12/2021	Fecha Terminación de la Obra :	31/03/2022
------------------------------	------------	--------------------------------	------------

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.361780, -112.296819
---	------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. CompraNet	2362847		Tipo de Contratación	Invitación a cuando menos 3	
Fecha de Publicación	12/11/2021	Fecha Presenta Propuestas	27/11/2021	Fecha Fallo	29/11/2021
Fecha Inicio Contrato	01/12/2021	Fecha Termina Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 440,017.12	\$ 440,017.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 880,034.24

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,008.56	\$ 220,008.56	\$ 220,008.56	\$ 220,008.56	\$ 880,034.24	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Noviembre	0%	
Diciembre	2%	
Enero	6%	
Febrero	91%	
Marzo	1%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *				
	INVERSIÓN TOTAL		INVERSIÓN FEDERAL	
\$	-	\$	-	-
\$	-	\$	-	-
\$	69,441.07	\$	34,720.54	
\$	-	\$	-	
\$	810,593.16	\$	405,296.58	
\$	880,034.23	\$	440,017.12	

Fotografías de Avance Fisico (Archivo en formato Jpg Menor a 1.0 MB)			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

\* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
Comisión Estatal del Agua

*[Signature]*

**Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón**  
Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Comisión Nacional del Agua

*[Signature]*

**Ing. Julio César Villarreal Traveña**  
Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:					
Descripción de la Obra / Acción					
PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE DESVÍO DE EXCEDENCIAS PLUVIALES EN EL CÁRCAMO NO. 3, DE LA CIUDAD DE LA PAZ.					
Fecha de Inicio de la Obra:		09/12/2021		Fecha Terminación de la Obra:	
				31/03/2022	
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)			24.115730, -110.344293		
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Fisico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2368349		Tipo de Contratación		Invitación a cuando menos 3
Fecha de Publicación	24/11/2021	Fecha Presenta Propuestas	06/12/2021		Fecha Fallo
					08/12/2021
Fecha Inicio Contrato	09/12/2021		Fecha Termin Contrato		31/03/2022
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,237,000.12	\$ 218,294.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,455,294.26

Datos requeridos

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	25%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 363,823.57	\$ 363,823.57	\$ 363,823.57	\$ 363,823.55	\$ 1,455,294.26	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Noviembre	0%	
Diciembre	10%	
Enero	30%	
Febrero	45%	
Marzo	15%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSION TOTAL	INVERSION FEDERAL
Noviembre	\$ -	\$ -
Diciembre	\$ -	\$ -
Enero	\$ -	\$ -
Febrero	\$ -	\$ -
Marzo	\$ 1,455,294.26	\$ 1,237,000.12
Total	\$ 1,455,294.26	\$ 1,237,000.12

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
MES	Foto 1	Foto 2	Foto 3
Noviembre	N/A	N/A	N/A
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
  
 Ing. Julio César Villarreal Trasvina  
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:  
 Descripción de la Obra / Acción  
 CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO. 11, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LAS COLONIAS: JACINTO LÓPEZ, INDEPENDENCIA, MAGISTERIAL, LÁZARO CÁRDENAS, GUELATAO Y LA ESCONDIDA DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Datos requeridos

Fecha de Inicio de la Obra: 07/10/2021 Fecha Terminación de la Obra: 31/03/2022

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.146498, -110.284637

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2330442		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	17/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	28/09/2021	Fecha Fallo	06/10/2021
Fecha Inicio Contrato	07/10/2021	Fecha Termino Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 521,872.43	\$ 637,844.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,159,716.50

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	15%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 197,151.81	\$ 197,151.81	\$ 197,151.81	\$ 197,151.81	\$ 197,151.81	\$ 173,957.45	\$ 1,159,716.50	

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	30%	
Diciembre	0%	
Enero	14%	
Febrero	36%	
Marzo	20%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	1,146,462.51	\$ 515,908.13
\$	1,146,462.51	\$ 515,908.13

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Noviembre			
Diciembre			
Enero			
Febrero			
Marzo			

\$ 5,964.30

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua  
  
 Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua  
  
 Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
 Director Local

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31-mar-22

FS-PROAGUA-01

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FISICO FINANCIERO DE LA ACCION:

Descripción de la Obra / Acción:

CONSTRUCCIÓN DE SECTOR HIDRÁULICO NO.10, CONSISTENTE EN ADECUACIÓN DE CRUCEROS DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LAS COLONIAS: LIENZO CHARRO, VICENTE GUERRERO (ZONA ALTA) Y LOMA LINDA (ZONA BAJA) DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Fecha de Inicio de la Obra: 07/10/2021 Fecha Terminación de la Obra: c

Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth): 24.139995, -110.289887

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Fisico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EXPEDIENTE

No. CompraNet	2330400	Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional		
Fecha de Publicación	17/09/2021	Fecha Presenta Propuestas	28/09/2021	Fecha Fallo	06/10/2021
Fecha Inicio Contrato	07/10/2021	Fecha Término Contrato	31/03/2022		

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 1,440,324.74	\$ 1,760,692.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,201,017.65


Datos requeridos

Avance Fisico Mensual PROGRAMADO (%)											
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total	
0%	0%	0%	0%	17%	17%	17%	17%	17%	15%	100%	

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)											
Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 544,173.00	\$ 480,152.65	\$ 3,201,017.65	

Avance Fisico Real en el MES (%)		
MES	FISICO (%)	OBSERVACIONES
Agosto	0%	
Sept.	0%	
Octubre	0%	
Noviembre	30%	
Diciembre	0%	
Enero	18%	
Febrero	22%	
Marzo	30%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL	
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,179,939.97	\$ 1,430,972.98	\$ -
\$ 3,179,939.97	\$ 1,430,972.98	\$ -

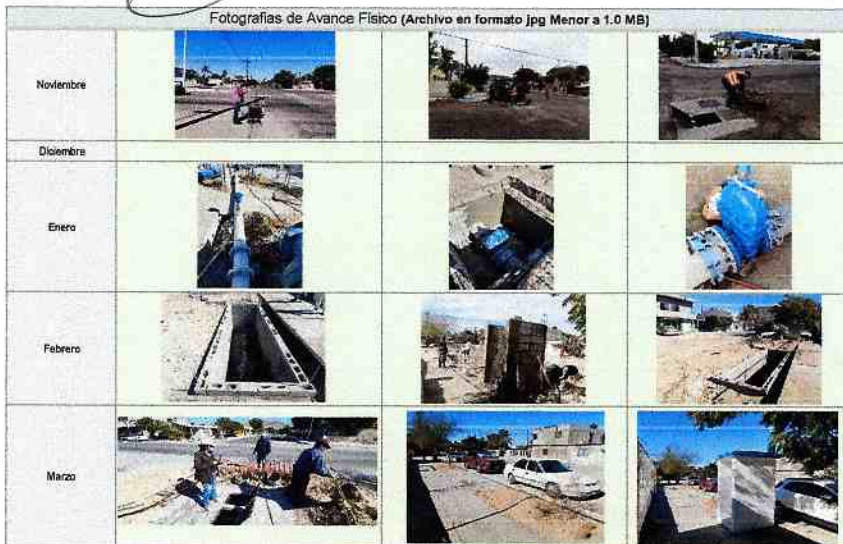

¿Economía?  
 \$ 9,351.76  
 Diferencia.

\* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa  
 Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón  
 Directora General

Por el Ejecutivo Federal  
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
 Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña  
 Director Local
