

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31 de agosto de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Cuerrero Negro.	

Fecha de Inicio de la Obra:	30/09/2022	Fecha Terminación de la Obra:	30/06/2023
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.979646°, -114.051488°
---	--------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2498600		Tipo de Contratación		Licitación Pública
Fecha de Publicación	07/09/2022	Fecha Presenta Propuestas	22/09/2022	Fecha Fallo	27/09/2022
Fecha Inicio Contrato	30/09/2022	Fecha Término Contrato	30/06/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,949,863.38	\$ 4,541,569.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,491,432.81

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	30%	30%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,143.28	\$ 749,143.28	\$ 1,498,286.56	\$ 2,247,429.84	\$ 2,247,429.85	\$ -	\$ 7,491,432.81


Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	30%	Avance conforme al importe autorizado en el Anexo Técnico.
Noviembre	0%	
Diciembre	5%	
Enero	5%	
Febrero	20%	
Marzo	12%	
Abril	8%	
Mayo	9%	
Junio	11%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *	
INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$ 1,706,299.51	\$ 665,456.81
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 424,868.13	\$ 212,434.06
\$ 766,460.30	\$ 383,230.15
\$ 1,662,793.02	\$ 782,904.21
\$ 840,231.44	\$ 376,599.94
\$ 1,074,628.86	\$ 481,659.12
\$ 106,153.53	\$ 47,579.09
\$ 909,598.02	\$ -
\$ 7,491,432.81	\$ 2,949,863.38

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua



Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua



Ing. Lesvia Tatiana Davis-Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31 de agosto de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos


ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:					
Descripción de la Obra / Acción					
Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.					
Fecha de Inicio de la Obra:		13/12/2022	Fecha Terminación de la Obra:		31/08/2023
Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)					
24.115371°, -110.344315°					
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
EXPEDIENTE					
No. Compra/Net	2541812		Tipo de Contratación	Licitación Pública Nacional	
Fecha de Publicación	22/11/2022	Fecha Presentación Propuestas	05/12/2022	Fecha Fallo	09/12/2022
Fecha Inicio Contrato	13/12/2022	Fecha Término Contrato	31/08/2023		
Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 17,991,847.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,991,847.76

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	40%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,397,554.33	\$ 2,518,858.69	\$ 5,037,717.37	\$ 5,037,717.37	\$ 17,991,847.76

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Diciembre	0%	
Enero	10%	
Febrero	13%	
Marzo	20%	
Abril	7%	
Mayo	7%	
Junio	13%	
Julio	9%	
Agosto	21%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	5,397,554.33	5,397,554.33
\$	-	-
\$	-	-
\$	-	-
\$	4,174,035.73	4,174,035.73
\$	-	-
\$	2,520,112.02	2,520,112.02
\$	534,463.80	534,463.80
\$	5,365,681.88	5,365,681.88
\$	17,991,847.76	17,991,847.76

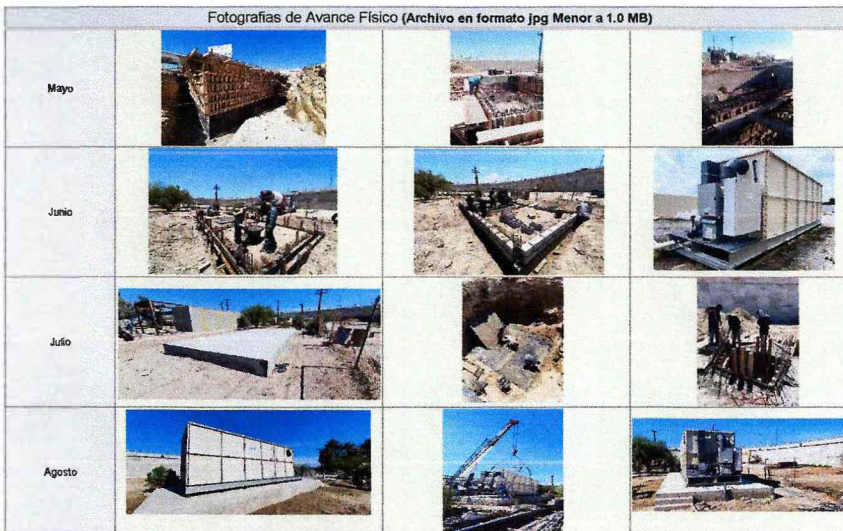

* Los importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvía Tatiana Davis Monzón

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO 2023 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)**

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31 de agosto de 2023

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCIÓN:	
Descripción de la Obra / Acción	
Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Cuerrero Negro	

Fecha de Inicio de la Obra:	30/09/2022	Fecha Terminación de la Obra:	30/06/2023
-----------------------------	------------	-------------------------------	------------

Ubicación Geográfica de la Obra/Acción (Google Earth)	27.979646°, -114.051488°
---	--------------------------

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)					
Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

EXPEDIENTE					
No. Compra/tes	2498600	Tipo de Contratación	Licitación Pública		
Fecha de Publicación	07/09/2022	Fecha Presente Propuestas	22/09/2022	Fecha Fallo	27/09/2022
Fecha Inicio Contrato	30/09/2022	Fecha Termino Contrato	30/06/2023		

Inversión CONTRATADA					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros (FISE)	Suma
\$ 2,949,863.38	\$ 4,541,569.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,491,432.81

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
0%	0%	0%	0%	10%	10%	20%	30%	30%	0%	100%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO \$ (incluye Inversión Federal y Contraparte)										
Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Total
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 749,143.28	\$ 749,143.28	\$ 1,498,286.56	\$ 2,247,429.84	\$ 2,247,429.85	\$ -	\$ 7,491,432.81

Avance Físico Real en el MES (%)		
MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Octubre	30%	Avance conforme al importe autorizado en el Anexo Técnico.
Noviembre	0%	
Diciembre	5%	
Enero	5%	
Febrero	20%	
Marzo	12%	
Abril	8%	
Mayo	9%	
Junio	11%	
Julio	0%	
Agosto	0%	
Total Acumulado	100%	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos) *		
	INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
\$	1,706,299.51	\$ 665,456.81
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	424,868.13	\$ 212,434.06
\$	766,460.30	\$ 383,230.15
\$	1,662,793.02	\$ 782,904.21
\$	840,231.44	\$ 376,599.94
\$	1,074,628.86	\$ 481,659.12
\$	106,153.53	\$ 47,579.09
\$	909,998.02	\$ -
\$	7,491,432.81	\$ 2,949,863.38

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

[Signature]

Ing. Julio César Villarreal Trasviña

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

[Signature]

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
