

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

Lugar: Virtual y Presencial
(en oficinas de la CEA)
Fecha: 16 de diciembre de 2022
Hora: 11:00 horas

PARTICIPANTES:

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón. Presidenta de la CORESE y Directora General de la CEA.
Ing. Julio César Villarreal Trasviña. Secretario de la CORESE y Director Local de la CONAGUA en BCS.

VOCALES DEL EJECUTIVO ESTATAL CEA:

Ing. Uriel Cano Castro. Coordinador Técnico.
Ar. Kenia Castro Nery. Jefa del Departamento de Estudios y Proyectos.
Lic. Silvia Llanet Peraza Verde. Jefa del Departamento de Cultura del Agua.
Lic. Silvia Barraza Escoboza. Jefa del Departamento Jurídico.
L.C. Verónica Castro Rosas. Encargada del Control Interno.

VOCALES DEL EJECUTIVO FEDERAL CONAGUA, DIRECCIÓN LOCAL:

Ing. Cruz Antonio Green Valdez. Encargado de la Subdirección del Área de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.
Arq. Mauricio Hernández Franco. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.
Ing. Mauricio Armando Verduzco Green. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Dirección Local.
Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.
Ing. César Cueva Rubio. Personal de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

INVITADOS QUE ASISTIERON

Por el Gobierno del Estado de Baja California Sur y por los Organismos Operadores Municipales
C.P. Armando Cota Núñez. Representante de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Ing. Eduardo Cortez Peña. Representante de la Contraloría General del Estado.
Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez. Director General del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Sergio Aguilar García. Personal del OOMSAPAS de La Paz.
Ing. Raymundo Loya Flores. Director General del OOSAPAS de Comondú.
Arq. Esthela Zepeda. Personal del Área Técnica del OOSAPAS de Comondú.
Ing. Jesús Getzemaní López Rubio. Director Técnico del OOMSAPA de Loreto.
Ing. Jesús Fernando Larios Osuna. Personal del OOMSAPAS de Los Cabos.
Ing. Yolanda Patricia Álvarez Coronado. Directora Administrativa y Operativa del OOMSAPAS de Mulegé.

Objetivo:

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

Presentar los avances del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2022).

Desarrollo de la Reunión:

Mediante Oficio Circular No. CEA/DG/DPUL-0873/2022, se realizó la Invitación a la Novena Reunión Ordinaria del Ejercicio 2022, anexo al mismo, se dio a conocer a los asistentes el "Orden del Día", el cual consta de:

1. *Lista de asistencia*
2. *Bienvenida*
3. *Avances del PROAGUA 2022*
4. *Asuntos Generales*
5. *Clausura de la reunión*

PUNTO 1. LISTA DE ASISTENCIA

Se llevó a cabo la lista de asistencia de manera virtual y presencial, estando presentes la Presidenta y el Secretario de la CORESE, 5 Vocales del Ejecutivo Estatal y 5 Vocales del Ejecutivo Federal, así como la representación de los invitados, contando con el quórum legal para iniciar la Novena Reunión Ordinaria de la CORESE del Ejercicio 2022.

PUNTO 2. BIENVENIDA

La Presidenta de la CORESE, da una cordial bienvenida a todos los asistentes.

PUNTO 3. AVANCES DEL PROAGUA 2022.

CEA presenta los avances de las acciones del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2022), las cuales se encuentran conforme se relaciona a continuación:

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Capacitación Escuela del Agua.
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratada).
- Reposición, equipamiento e interconexión del pozo No. 18 del acueducto No. 2, ubicado en la zona de Los Bledales, en La Paz.
Avance: Físico 72% - Financiero 59% (Contratado).

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

- Construcción de 1,158.00 metros lineales de colector Tabachines de 15" de diámetro de PVC SDR-35, en La Paz.
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).
- Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en Álvaro Obregón.
Avance: Físico 70% - Financiero 46% (Contratado).
- Construcción tanque elevado metálico capacidad de 30 m³, en La Trinidad.
Avance: Físico 70% - Financiero 46% (Contratado).
- Proyecto ejecutivo de un sistema de alcantarillado sanitario y análisis de alternativas para el saneamiento de las aguas residuales, de las localidades de El Sargento y La Ventana, Municipio de La Paz.
Avance: Físico 40% - Financiero 0% (Contratada).
- Relocalización de pozo profundo en la localidad de Ciudad Insurgentes.
Avance: Físico 65% - Financiero 53% (Contratado).
- Ampliación de drenaje sanitario en la colonia Paseos de Don Pelayo consistente en 3,113 metros lineales de red de atarjeas y 149 descargas sanitarias, Ciudad Constitución.
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).
- Reposición de pozo profundo en el poblado de San Juanico.
Avance: Físico 85% - Financiero 71% (Contratado).
- Ampliación de 1.0 kilómetros de red de agua potable y 75 tomas domiciliarias en la colonia Miramar, en Loreto.
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).
- Construcción de 1.8 kilómetros de red de alcantarillado sanitario, 156 descargas domiciliarias, 1.26 kilómetros de emisor y estación de bombeo en colonia Vista al Mar, en Loreto.
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado)
- Reposición de pozo profundo número 4, en Guerrero Negro.
Avance: Físico 99% - Financiero 99% (Contratado.)
- Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 1, en Guerrero Negro.
Avance: Físico 80% - Financiero 60% (Contratado).

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales No. 2, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 80% - Financiero 74% (contratado).
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de estaciones de bombeo de aguas residuales No. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 40% - Financiero 23% (Contratada).
- *Proyecto Ejecutivo de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, en Guerrero Negro.*
Avance: Físico 45% - Financiero 25% (Contratada).
- *Reconstrucción de 1.6 kilómetros del Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte, con tubería de PEAD de 16" de diámetro RD-9, en la localidad de Bahía Tortugas.*
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Contratada)
- *Rehabilitación y equipamiento electromecánico de dos pozos, en Heroica Mulegé.*
Avance: Físico 95% - Financiero 30% (Alta - en proceso de licitación)
- *Equipamiento electromecánico de estación de bombeo de aguas residuales en Heroica Mulegé.*
Avance: Físico 65% - Financiero 30% (Contratada)
- *Rehabilitación de la planta de tratamiento en la colonia INVI, Nuevo Mulegé, en la población de Heroica Mulegé.*
Avance: Físico 99% - Financiero 0% (Contratado)
- *Construcción de obras de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo no. 3, de la ciudad de La Paz.*
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Contratada)

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo de la Comisión Estatal del Agua)

- *Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPA de Loreto.*
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).
- *Catastro técnico de la infraestructura hidráulica de Todos Santos.*
Avance: Físico 45% - Financiero 0% (Contratado).

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Construcción de red de agua potable en colonia Azteca y 318 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (contratado).
- Construcción de red de agua potable en colonia Cabo Fierro y 351 tomas domiciliarias, en Cabo San Lucas.
Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratado).
- Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales, en comunidad de Santiago.
Avance: Físico 60% - Financiero 50% (Contratado).

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL (a cargo del OOMSAPAS de Los Cabos)

- Elaboración de Plan de Desarrollo Integral del OOMSAPAS de Los Cabos.
Avance: Físico 100% - Financiero 50% (Contratado)

ACCIONES EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES

- Construcción de subcolector Marcelo Rubio de 588 mts de longitud, tubería de 45 cm de diámetro en La Paz.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Fallo el 20 de dic.)
- Construcción de colector Santa Rosa de 965 m de longitud, tubería de 60 cm de diámetro en La Paz.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Fallo el 20 de dic.)
- Sistema de tratamiento de aguas residuales, cárcamo de bombeo y emisor a presión en la localidad de El Pescadero.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Apertura el 26 de dic.)
- Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo de la línea de conducción y potabilizadora para los volúmenes de la Presa "La Buena Mujer", municipio de La Paz, B.C.S.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (Fecha de contrato el 19 de dic.)

ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL

- Suministro e instalación de 4,242 micro medidores de gasto de ½" tipo chorro múltiple en sectores de la ciudad de La Paz, incluye sistema de lectura drive by y cuadro de medición.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Fallo el 20 de dic.)

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

- Suministro e instalación de 4,242 micro medidores de gasto de ½" tipo chorro múltiple en sectores de la ciudad de La Paz, incluye sistema de lectura drive by y cuadro de medición.
Avance: Físico 0% - Financiero 0% (En proceso de licitación - Fallo el 20 de dic.)

ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA

Acción de Desinfección	Meta	Avance
Instalaciones (EQ1 y EQ2)	5	5
Reposiciones (EQ3, EQ4)	2	2
Refacciones de equipos ARE	5	5
Rústicos (EQ6)	7	7
Gas Cloro (8 contenedores) AGC	7,256	7,256
Hipoclorito de calcio AHC/(Granular y Pastilla)	3,386.6	3,386.6
Plata Coloidal (AAG)	7,180	7,180
Pastillas DPD	720	720
Capacitación en Desinfección del Agua (CAO)	15	15

Avance: Físico 100% - Financiero 100% (Contratada).

Monitoreo de Cloro libre residual MCL	720	720
---------------------------------------	-----	-----

Avance: Físico 100% - Financiero 100%

CONTRALORÍA SOCIAL

CONTRALORÍA SOCIAL ACTIVIDAD	PROGRAMADO	REALIZADO	PROAGUA	
			OBSERVACIONES	
REUNIONES CON BENEFICIARIOS	72	50		
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CS	24	20		
REGISTRO DE OBRAS EN EL SICS	24	20		

TERCER MODIFICATORIO ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2022

APARTADO	FEDERAL	ESTATAL	OOM	OTROS (FISE)	TOTAL
URBANAS Y RURALES	\$119'856,261.45	\$22'745,662.62	\$8'627,384.01	\$7'076,263.65	\$158'305,571.73
DESARROLLO INTEGRAL	\$25'432,081.55	\$2'407,809.59	\$1'826,901.70	-	\$29'666,792.84
DESINFECCIÓN	\$838,163.00	\$838,214.96	-	-	\$1'676,377.96
TOTAL	\$146'126,506.00	\$25'991,687.17	\$10'454,285.71	\$7'076,263.65	\$189'648,742.53

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

PUNTO 4. ASUNTOS GENERALES.

Como primer tema de asuntos generales, CONAGUA comenta que la semana del 5 al 8 del mes en curso se realizaron visitas de obra por parte de personal del Departamento de Agua Potable, en las cuales se detectaron incongruencias dentro de lo reportado en los avances físico-financieros, con lo observado en la visita de campo, lo cual se notificará de manera oficial para que se generen las aclaraciones pertinentes. A este respecto CEA comenta que, se esperarán los reportes correspondientes, para analizar la información y programar si es posible, visitas conjuntas para realizar las aclaraciones pertinentes.

Como segundo asunto, se presenta el respectivo avance del PROAGUA 2021, relativo a la acción "Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR, de la ciudad de La Paz", la cual tiene un avance físico del 31%, y financiero del 64%. Como es sabido, esta acción cuenta con una prórroga al 31 de diciembre de 2022, por lo que es preciso comentar que, afortunadamente el día de hoy inició el traslado de los equipos, específicamente los 3 desarenadores, desde la fábrica que está ubicada en Estados Unidos a esta ciudad de La Paz, y una vez que éstos arriben, tienen que pasar por un proceso de instalación, y posteriormente pruebas, proceso que muy probablemente llegará al límite de los últimos días de diciembre. Lo preocupante en este caso es, que por el momento sólo se tiene prórroga al día 31 de los corrientes, pero una vez concluidos los mencionados trabajos en este mes, se tiene que iniciar con el trámite de pago de éstos, el cual muy seguramente será ingresado a la Secretaría de Finanzas y Administración hasta el mes de enero del ejercicio 2023, por lo que será necesario solicitar una prórroga sólo para el trámite de pago.

Ahora bien, comenta CEA también que, como se habrán percatado en el apartado de Avances físico - financieros, aparecen algunas acciones marcadas en color rojo, principalmente las Estaciones de bombeo de Guerrero Negro, el Acueducto Vizcaíno Pacífico Norte y los proyectos de Guerrero Negro, El Sargento y La Ventana, así como el Catastro de Todos Santos; acciones que no llevan un gran avance y no será posible su conclusión al 31 de diciembre, por lo que, de manera formal ya hicimos llegar una solicitud a la Dirección Local de CONAGUA, para efecto de que se analice la posibilidad de otorgar una prórroga para estas acciones, esperando contar con su apoyo, así como con el de todos los miembros de esta Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), para que nos sea autorizada.

OOMSAPAS La Paz comenta que ellos también solicitan a los presentes se considere la autorización de una prórroga al 31 de marzo de 2023, para concluir con la ejecución de sus acciones que se encuentran en proceso de licitación.

El Organismo Operador de Los Cabos, comenta que ellos también se adhieren a la solicitud de prórroga, en este caso, sólo por lo que se refiere a la Planta de Tratamiento de Santiago;

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

manifiestan que les preocupa el suministro de las partes de dicha acción, pues no obstante que ya han llegado algunos equipos, el resto se está tardando mucho y consideran que es en este punto en donde tienen reflejado un mayor atraso, como pudo corroborar el personal de la Dirección Local de CONAGUA a dicha obra, la cual lleva un avance del 60%. Creen que muy probablemente podrán concluir en los últimos días de enero o a inicios de febrero, por lo que solicitan una prórroga para la obra en comento.

Respecto a este tema, CEA comenta que si ha afectado bastante el suministro de los equipos, por el arribo vía marítima, incluso la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API) emitió un comunicado en el que da a conocer la problemática que se ha presentado en el traslado de las cargas por las navieras, tanto para su salida del Estado, pero principalmente para su ingreso.

Una vez expuesto todo lo anterior, CONAGUA comenta que, efectivamente se han recibido de manera oficial algunas de las solicitudes comentadas, por lo que en este momento someten a la consideración de todos los integrantes de esta CORESE, la aprobación de las solicitudes de prórroga para cada uno de los ejecutores, las cuales son autorizadas por unanimidad de votos.

Ahora bien, se somete también a la aprobación de los miembros de esta CORESE la autorización de una prórroga al mes de enero de 2023, para la acción "Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR, de la ciudad de La Paz", del PROAGUA 2021, sólo por lo que se refiere al pago de los trabajos pendientes de ésta; misma que se autoriza por unanimidad de votos.

CEA comenta que ya quedó firmado por ésta y por CONAGUA, el POA 2023 y lo pone a la vista de los asistentes a esta sesión; asimismo, se invita a todos los Organismos Operadores a seguir trabajando en la integración de expedientes para que a su vez, sean validados por CONAGUA, pues se visualiza, por la experiencia del ejercicio actual, que dicho POA se va a ampliar, pero para considerar nuevas acciones, es importante tener los expedientes técnicos validados; cabe señalar que ya se tienen algunos expedientes, mismos que se están detallando, otros ya están en CONAGUA en proceso de validación, pero no debemos bajar la guardia, debido a que en cuanto se nos asignen más recursos, para poder incluir acciones, es necesario contar con sus expedientes técnicos validados; por lo anterior, se les solicita seguir trabajando en éstos, priorizando acciones, enfocándonos en las más relevantes y con mayor beneficio social.

CONAGUA reitera la solicitud realizada en la sesión anterior, en cuanto a que se les haga llegar la documentación comprobatoria de la contraparte de todos y cada uno de los ejecutores, al igual que la relativa al reintegro de los 30 mil pesos, más las cargas financieras.

COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA

Respecto al tema del reintegro la Secretaría de Finanzas y Administración comenta que ya está el tema en la Tesorería y se tiene como fecha límite para realizar el pago de dicho reintegro por el orden de \$38,898.00, el 28 de diciembre.

CONAGUA hace la corrección y comenta que, ellos tienen conocimiento de que ese pago ya se realizó, pero no cuentan con la documentación comprobatoria, a lo que la Secretaría de finanzas y Administración argumenta que, efectivamente ya se efectuó el reintegro en comento, por lo que a la brevedad harán llegar el documento que así lo acredita, y quedarán en espera de que se les requiera el pago de las cargas financieras generadas.

ACUERDOS.

ACUERDO 01/2022. Se autoriza por unanimidad de votos, la prórroga de las acciones solicitadas por todos y cada uno de los ejecutores, para concluir éstas a más tardar el 31 de marzo de 2023.

ACUERDO 02/2022. Se autoriza por unanimidad de votos, una prórroga al mes de enero de 2023, para la acción "Reparación de daños ocasionados por el huracán Olaf, en la planta de tratamiento y sistema de pretratamiento de la PTAR, de la ciudad de La Paz", sólo por lo que se refiere al pago de los trabajos pendientes de ésta.

PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidenta de la CORESE, da por Clausurada esta Novena Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022, siendo las 11:56 horas del día de su inicio.

Por la CORESE

Presidenta



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón


Secretario




Ing. Julio César Villarreal Traviña

**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA**


Por la Comisión Estatal del Agua
Vocales del Ejecutivo Estatal




Ing. Uriel Cano Castro




Lic. Silvia Barraza Escoboza



Arq. Kenia Castro Nery




Lic. Silvia Llanet Peraza Verde.




L.C. Verónica Castro Rosas

Por la Comisión Nacional del Agua
Vocales del Ejecutivo Federal



Ing. Cruz Antonio Green Valdez




Arq. Mauricio Hernández Franco


**COMISIÓN DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO
MINUTA DE LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA**


Ing. Mauricio Armando Verduzco Green

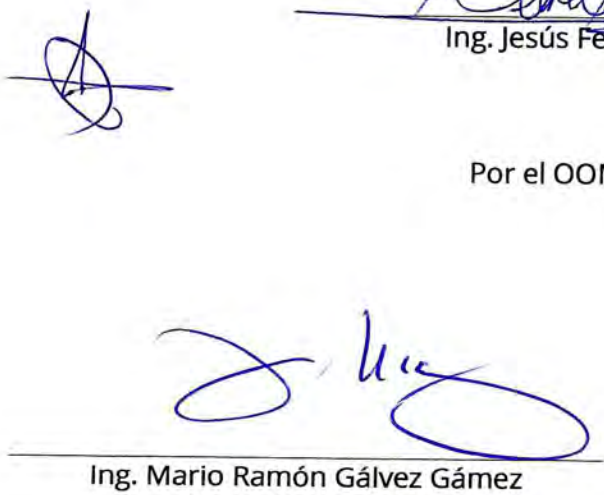

Ing. Erika Elizabeth Manríquez Moreno


Ing. César Cueva Rubio

Por el OOMSAPAS de Los Cabos


Ing. Jesús Fernando Larios Osuna

Por el OOMSAPAS de La Paz


Ing. Mario Ramón Gálvez Gámez


Ing. Sergio Aguilar García
