



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Urbano

Fecha: 31 de mayo de 2022

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:
Descripción de la Obra / Acción
REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN OLAF, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE PRETRATAMIENTO DE LA PTAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ
Fecha de inicio de la Obra: 18/11/2021 Fecha Terminación de la Obra: 30/06/2022
Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 24.107543,-110.343386
Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)
Inversión Ejercida
Federal Estado Municipio Org. Operador Otros Avance Físico (%)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EXPEDIENTE
No. Compra/Net 2353323 Tipo de Contratación Licitación Pública Nacional
Fecha de Publicación 27/10/2021 Fecha Presenta Propuestas 08/11/2021 Fecha Fallo 17/11/2021
Fecha Inicio Contrato 18/11/2021 Fecha Termina Contrato 30/06/2022
Inversión CONTRATADA
Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma
\$ 19,509,467.53 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 19,509,467.53


Table with 12 columns: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Total. Row 1: 0%, 0%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 6%, 88%, 100%.

Table with 12 columns: Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Total. Row 1: \$ -, \$ -, \$ 195,094.68, \$ 195,094.68, \$ 195,094.68, \$ 195,094.68, \$ 195,094.68, \$ 195,094.68, \$ 1,170,568.05, \$ 17,168,331.40, \$ 19,509,467.53.

Table with 3 columns: MES, FISICO (%), OBSERVACIONES. Rows for Oct to Jun. Observations: En proceso de fabricacion los 3 equipos desarenadores, y 3 set de variadores de frecuencia.

Table with 2 columns: INVERSIÓN TOTAL, INVERSIÓN FEDERAL. Rows for Oct to Jun. Total accumulated: \$ 10,902,714.60.

Fotografías de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

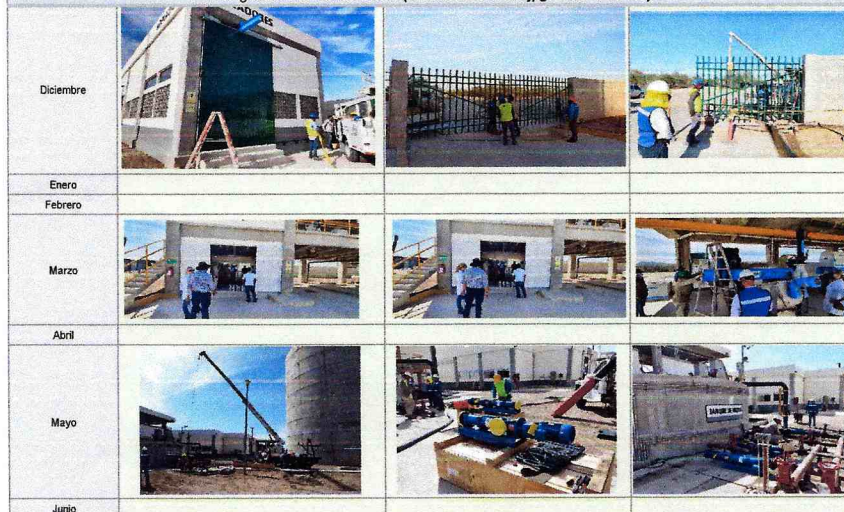

* Los Importes corresponden a las estimaciones autorizadas de los trabajos ejecutados y remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración, para el respectivo trámite de pago.

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon
Directora General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Ing. Julio César Villarreal Trasviña
Director Local
