



*La Paz, Baja California Sur a 09 de abril de 2026.
"2026, Cincuenta años de fundación del benemérito C. R. E. N. Marcelo Rubio Ruiz"
"2026, Año del cincuentenario de la fundación de la UABCS"
"2026, Año del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla"*

OFICIO: CEA/DG/CT/0202/26
ASUNTO: REPORTE MENSUAL DE AVANCES
FISICOS – FINANCIEROS (PROAGUA Y FISE 2025)

ING. JULIO CÉSAR VILLARREAL TRASVIÑA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BCS
P R E S E N T E



La suscrita, Directora General de la Comisión Estatal del Agua, por este conducto y con fundamento en los artículos 12, fracciones I y VI de la Ley Aguas del Estado de Baja California Sur vigente, así como 32, fracción I, del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal del Agua; con relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025, en específico a las Acciones para la Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Así como las obras ejecutadas del FISE 2025 – Ramo 33 con recursos del FAIS, FISE y FAISMUN.

Por medio del presente se hace entrega del avance físico – financiero correspondiente al mes de marzo del año 2026.

Así mismo se adjunta la actualización del cierre para el ejercicio fiscal 2025 del PROAGUA al 06 de abril de 2026.

Sin otro particular, aprovecho para mandar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General de la Comisión Estatal del Agua



**COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE B.C.S.**

c.c.p. - Archivo.
LTDM/ABHH

Dirección: Sinaloa s/n esq. Durango, Col. Pueblo Nuevo.
Código Postal: 23060.
Teléfono: 612 125 1536 - 612 122 2835
cea.bcs.gob.mx





1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
31	MARZO	2026

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR

3. Ejecutor: COMISION ESTATAL DEL AGUA

4. Reporte correspondiente al mes de:

MARZO

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación							Avances						
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)		Financiero Total (Pesos)			
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U032	Loreto	Loreto	Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (primera etapa).	P-2025-00048711	LO	31-jul-2025	LO-62-017-903017989-N-2-2025	11-ago-2025	15-mar-2026	\$ 23,005,723.98	\$ 72,854,012.18	33%	54%	87%	32,581,650.72	30,446,991.28	63,028,642.00
25U031	La Paz	La Paz	Fortalecimiento de capacidades	E-2025-00056788	IR	21-jul-2025	IA-62-017-903017989-N-3-2025	30-jul-2025	31-dic-2025	\$ 748,200.00	\$ 1,496,400.00	100%	0%	100%	1,496,400.00		1,496,400.00

Nota: En relación a la obra Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Loreto, municipio de Loreto (Primera Etapa), se han formalizado 2 convenios
-Primer Convenio Modificatorio en Tiempo Número LO-62-017-903017989-N-2-2025/1
-Segundo Convenio Modificatorio en Monto Número LO-62-017-903017989-N-2-2025/02

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

Ing. Uriel Esno Osorio
Coordinador Técnico

Aprobó:


Ing. Lesvia Tatiana Dávila Monzón
Directora General



RELACIÓN LOCALIDADES ATENDIDAS POR PROAGUA 2025
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento


No.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	BENEFICIARIOS	IMPORTE EJERCIDO
1	LORETO	LORETO	“REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DE LORETO (PRIMERA ETAPA) 30 LPS”	16,311	\$ 63,028,642.00

Elaboró:




Ing. Aldo Bryan Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Supervisión y Control de Obra

Vo.Bo.:

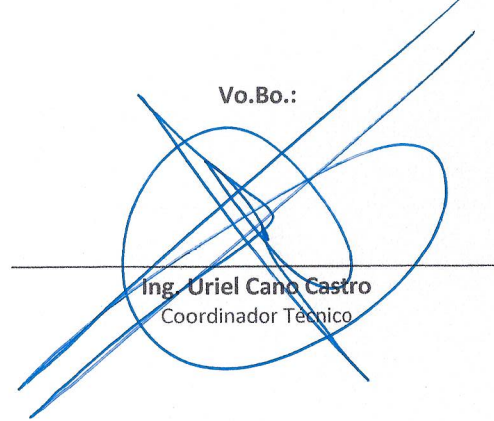

Ing. Uriel Cano Castro
Coordinador Técnico

Aprobó:



Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón
Directora General



COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA DE B.C.S.
