



**Gobierno del Estado de Baja California Sur**  
**Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad**  
**Comisión Estatal del Agua**

Convenio Modificatorio número **LO-903017989-E6-2019/01**

Convenio Modificatorio al Contrato número LO-903017989-E6-2019, que celebran por una parte la **Comisión Estatal del Agua de Baja California Sur**, a la que se denominará "La Contratante" representada por el **Ing. Jesús Antonio Solano Leyva**, en su carácter de Director General, y por la otra **COMZUM-E, S.A. DE C.V.**, a quien se le denominará "El Contratista", representada por la **MC. Abigail García Castro**, en su carácter de Representante Legal, de acuerdo a los antecedentes, declaraciones, y cláusulas siguientes:

**Antecedentes**

- 1.- Con fecha 19 de agosto de 2019, la **Comisión Estatal del Agua de Baja California Sur**, en este acto denominada "La Contratante", y **COMZUM-E, S.A. DE C.V.**, "El Contratista", celebraron el Contrato de Obra Pública Número **LO-903017989-E6-2019**, en el cual "El Contratista" se obligó a realizar, de acuerdo con las cláusulas del mencionado contrato la obra denominada "**Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 tipo Anger para aguas negras en la colonia La Pasión**" en la localidad de La Paz, municipio de La Paz.
- 2.- Que el monto pactado en el citado contrato para la ejecución de los trabajos relativos a la obra "**Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 tipo Anger para aguas negras en la colonia La Pasión**", es de \$1,363,878.02 (son un millón trescientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 02/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
- 3.- Que el plazo pactado en el citado contrato para la ejecución de los trabajos relativos a la obra "**Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 tipo Anger para aguas negras en la colonia La Pasión**", era de 90 días naturales, del día 19 de agosto de 2019 al 17 de noviembre de 2019.
- 4.- Con fecha 15 de noviembre de 2019, "El Contratista", solicitó una reprogramación de la obra "**Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 tipo Anger para aguas negras en la colonia La Pasión**", por la afectación al programa original de los trabajos, tras la ocurrencia de diversos eventos meteorológicos durante la presente temporada ciclónica del Pacífico mexicano, y concluir los trabajos a más tardar el 31 de diciembre de 2019.
- 5.- Mediante Dictamen número DIC-TEC-EMI/19 de fecha 15 de noviembre de 2019, se fundó y motivó la justificación para celebrar el Convenio Modificatorio en Tiempo, al autorizarse la solicitud de reprogramar la ejecución de la obra denominada "**Construcción de emisor a presión de 10" de diámetro de PVC RD-26 tipo Anger para aguas negras en la colonia La Pasión**", los cuales se encuentran descritos en el dictamen de mérito, mismo que forma parte integral del presente convenio.



**Gobierno del Estado de Baja California Sur**  
**Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad**  
**Comisión Estatal del Agua**

Convenio Modificatorio número **LO-903017989-E6-2019/01**

**Declaraciones**

**I.- “La Contratante” declara que:**

I.1 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 9, fracción III y 12, fracciones I y VII, de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, el Director General **Ing. Jesús Antonio Solano Leyva**, tiene facultad expresa para suscribir el presente convenio.

I.2.- El **Ing. Jesús Antonio Solano Leyva**, acredita su personalidad mediante el nombramiento otorgado por el **Lic. Carlos Mendoza Davis**, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, de fecha 26 de octubre de 2015.

I.3.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, se cuenta con recursos del Apartado Urbano del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio 2019.

I.4.- El presente convenio tiene sustento legal en los artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 99, 100, 102 y 109 de su Reglamento.

**II.- “El Contratista” declara que:**

II.1.- **COMZUM-E, S.A. DE C.V.**, es una sociedad mercantil legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número 837, volumen IV, del Libro Único, de fecha 15 de marzo de 2008, pasada ante la fe del Lic. Eleuterio Ríos Espinoza, Notario Público No. 133, con residencia en la Ciudad de Culiacán de Rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa; y que cuenta con la capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente Convenio.

II.2.- Que la **MC. Abigail García Castro**, acredita su carácter de Representante Legal, quien tiene facultad para celebrar el presente convenio, conforme a la escritura pública número 837, Volumen IV, Libro Único, de fecha 15 de marzo de 2008, pasada ante la fe del Lic. Eleuterio Ríos Espinoza, Notario Público No. 133, con residencia en la Ciudad de Culiacán de Rosales, municipio de Culiacán, Sinaloa.

En virtud de lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

**Cláusulas.**

**Primera:** Objeto del Convenio Modificatorio.- “La Contratante” conviene con “El Contratista” una modificación al plazo originalmente pactado al contrato número **LO-903017989-E6-2019** de fecha 19 de agosto de 2019; modificación consistente en: aumento de **44 días naturales** adicionales al plazo originalmente pactado.



**Gobierno del Estado de Baja California Sur**  
**Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad**  
**Comisión Estatal del Agua**


Convenio Modificatorio número **LO-903017989-E6-2019/01**

**Segunda:** Monto del Contrato.- Las partes convienen NO modificar el monto original del contrato que importa la cantidad de: \$1,363,878.02 (son un millón trescientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 02/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

**Tercera:** Plazo de Ejecución.- “El Contratista” expresa su conformidad con las adiciones a que se refiere la Clausula Primera, y se compromete a terminar la obra objeto del presente convenio a más tardar el día 31 de diciembre de 2019, según las especificaciones técnicas y a lo estrictamente pactado en el contrato número LO-903017989-E6-2019 de fecha 19 de agosto de 2019.

Leído que fue por las partes que en el intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente convenio modificatorio al contrato número **LO-903017989-E6-2019**, al calce y al margen de todas sus fojas útiles en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, el 15 de noviembre de 2019.

Por “La Contratante”  
**Comisión Estatal del Agua**

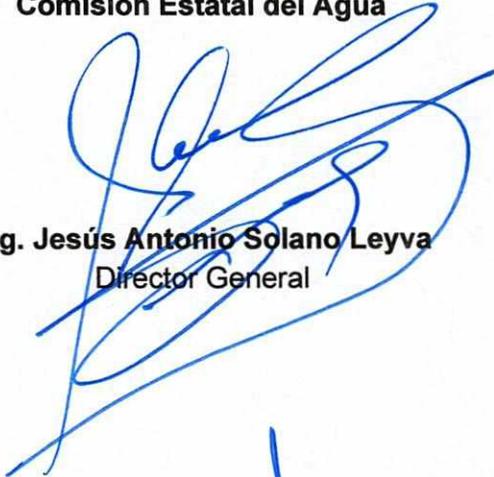

**Ing. Jesús Antonio Solano Leyva**  
Director General

Por “El Contratista”  
**COMZUM-E, S.A. de C.V.**



**MC. Abigail García Castro**  
Representante Legal

TESTIGOS



**Lic. Silvia Barraza Escoboza**  
Encargada la Unidad Jurídica de La CEA



**Ing. Uriel Cano Castro**  
Coordinador Técnico y  
Control de Obras de la CEA
